


ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่งใน สปป.ลาว			
ขอบเขตโครงการ	ก่อสร้างโรงกรองน้ำและท่อส่ง-จ่ายน้ำ จำนวน 5 เมือง ได้แก่			
	1) เมืองแบง แขวงอุดมไซ (49.90 ล้านบาท)			
	2) เมืองคอบ แขวงไชยบุรี (50.39 ล้านบาท)			
	3) เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (68.36 ล้านบาท)			
	4) เมืองไชบูลี แขวงสะหวันนะเขต (89.21 ล้านบาท)			
	5) เมืองโขง แขวงจำปาสัก (39.84 ล้านบาท)			
แหล่งเงินทุน				
	1) งบประมาณแผ่นดิน 100 ล้านบาท			
	2) เงินสะสมของ สพพ. 110 ล้านบาท			
	3) เงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ 100 ล้านบาท			
วงเงิน / ค่าใช้จ่าย	รายการ	ตามสัญญาเงินกู้ (ล้านบาท)	ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	ตามสัญญาจ้าง (มี VO) (ล้านบาท)
	1) ค่างานโยธา	280.50	278.48	286.96
	2) ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน	10.00	10.00	10.73
	3) ค่าฝึกอบรม (ให้เปล่า)	5.00	4.24	4.24
	4) ค่าบริหารจัดการ	2.50	2.50	2.50
	5) ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด	12.00	-	-
	รวม	310.00	295.22	304.43
มติคณะรัฐมนตรี	10 กันยายน 2556			
ลงนามสัญญา	18 กันยายน 2556			
เงื่อนไขทางการเงิน				
- วงเงินรวม	310 ล้านบาท			
- เงินกู้	305 ล้านบาท			
- เงินให้เปล่า	5 ล้านบาท			
- อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 1.5 ต่อปี			
- อายุสัญญา	20 ปี (รวมระยะปลอดหนี้ 5 ปี)			
- ค่าบริหารจัดการของ สพพ.	ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้			
- ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา	นิติบุคคลไทย			
- การใช้สินค้าและบริการจากไทย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50			
- กฎหมายใช้บังคับ	กฎหมายไทย			
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประปา สปป.ลาว (Department of Water Supply, MPWT) Madame Phouvong CHANTHAVONG, Project Manager Tel/Fax: +856-21-452040			

วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด - งานหลัก: ระยะเวลาดำเนินงาน 15 เดือน (เริ่ม 1 ส.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 58) - งานเพิ่มเติม: ระยะเวลาดำเนินงาน 2 เดือนครึ่ง (เริ่ม 15 ส.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59)
ผู้รับเหมาก่อสร้าง	บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริง จำกัด - งานหลัก: ระยะเวลาดำเนินงาน 17 เดือน (รวมขยายระยะเวลา 2 เดือน) (เริ่ม 1 ก.ย. 57 ถึง 31 ม.ค. 59) - งานเพิ่มเติม: ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือนครึ่ง (รวมขยายระยะเวลา 1 เดือน) (เริ่ม 15 ส.ค. 59 ถึง 30 พ.ย. 59)
กำหนดงานแล้วเสร็จ	- งานหลัก: 31 ม.ค. 59 - งานเพิ่มเติม: 30 พ.ย. 59
ผลการดำเนินงาน	- 31 มกราคม 2559 งานก่อสร้างหลักแล้วเสร็จ - 27 กรกฎาคม 2559 คพพ. มีมติอนุมัติให้ใช้วงเงินในหมวดค่า Contingency สำหรับงานเพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 9,218,890 บาท สำหรับงานปรับปรุงทางเข้าโรงงานผลิตน้ำประปา งานติดตั้งหลักบอกรอแนวท่อน้ำ งานติดตั้งต้ายล้อมรอบฐานหอสูบน้ำดิบ (เมืองไชบูลี) และค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม - 30 พฤศจิกายน 2559 งานเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1) เป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสร้างความรู้สึที่ดีต่อประเทศไทยและประชาชนลาว 2) มีการใช้สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากประเทศไทยภายใต้การดำเนินโครงการที่กล่าวมากถึงร้อยละ 85 ของมูลค่าโครงการเช่นท่อ PVC ท่อเหล็ก มิเตอร์น้ำ เครื่องสูบน้ำ สารเคมีสำหรับการบำบัดน้ำ และ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 3) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการกิจการน้ำประปาของไทยเข้าไปทำงานหรือลงทุนระบบน้ำประปาใน สปป.ลาว

แผนที่โครงการ

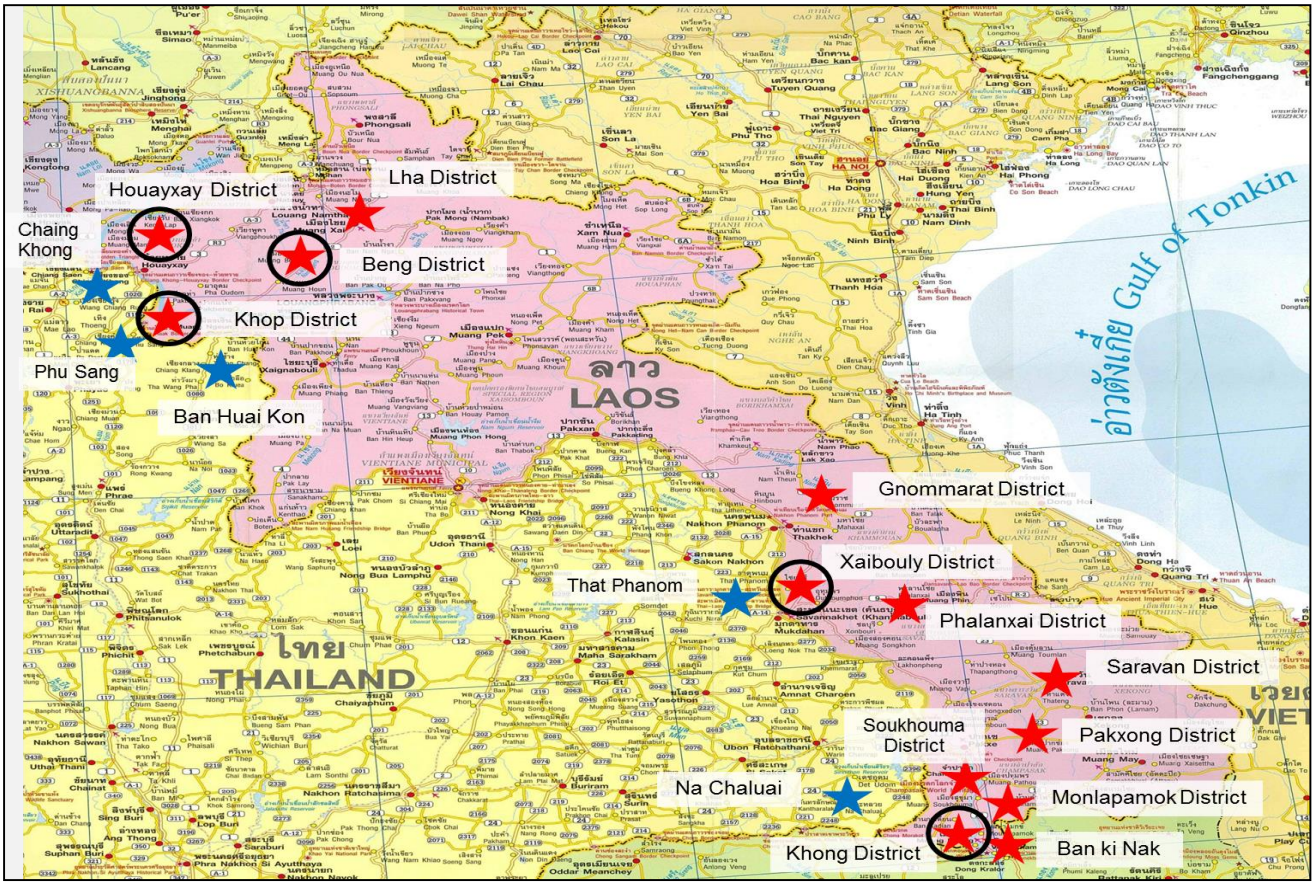

สำนักบริหารโครงการ 1
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
