

ประเทศเมียนมา: โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง
(เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา

1. ข้อมูลโครงการ

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ชื่อโครงการ: | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา | | |
| รหัสโครงการ: | MFA003/2020 | | |
| ประเทศ: | เมียนมา | | |
| สาขา: | การพัฒนาพื้นที่และเมือง | | |
| ปีอนุมัติ: | 2563 | | |
| หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: | กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy: MOEE) และ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) | | |
| ขอบเขตโครงการ: | <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 แห่ง - ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดัน ระยะทางประมาณ 52 กม. - ติดตั้งและปรับปรุงสายจำหน่ายแรงดัน ระยะทางประมาณ 91 กม. - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า | | |
| วงเงินโครงการ (บาท): | รายการ | วงเงินอนุมัติ | วงเงินตามสัญญา |
| | - ค่าก่อสร้าง | 1,339,817,011.00 | 1,339,817,011.00 |
| | - ค่าบริการที่ปรึกษา | 51,440,138.45 | 51,440,138.45 |
| | - ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด | 66,990,850.55 | - |
| | รวม | 1,458,248,000.00 | 1,391,257,149.45 |
| เงื่อนไขทางการเงิน: | <ul style="list-style-type: none"> - อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.5 ต่อปี - อายุสัญญา 30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี) - ค่าธรรมเนียมบริหารของ สฟพ. ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้ - วันชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 25 เมษายน และ 25 ตุลาคม - ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา นิติบุคคลไทย - การใช้สินค้าและบริการจากไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย | | |
| ระยะเวลาก่อสร้าง: | ประมาณ 24 เดือน | | |

2. วัตถุประสงค์โครงการ/ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

| | |
|---------------|--|
| วัตถุประสงค์: | ก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง |
| ผลประโยชน์: | <ul style="list-style-type: none"> - สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือนในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเมียนมา - ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง - ลดอัตราการสูญเสียไฟฟ้าระหว่างการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า |


3. วันที่สำคัญ

| | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| วันที่อนุมัติ FA: | 14 กรกฎาคม 2563 | วันที่ลงนามสัญญา: | 23 กันยายน 2563 |
| วันที่สัญญามีผลบังคับ: | 23 กันยายน 2563 | Restructuring (ถ้ามี): | - |
| วันที่สิ้นสุดเบิกจ่าย: | 22 กันยายน 2568 | Revised Closing (ถ้ามี): | - |

4. ยอดการเบิกจ่าย ณ เดือนพฤษภาคม 2567

| | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|
| วงเงินกู้: | 1,458,248,000.00 บาท | วงเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี): | - |
| วงเงินเบิกจ่ายสะสม: | - | การเบิกจ่าย ณ พ.ค. 67: | - |
| วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย: | 1,391,257,149.45 บาท | ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม: | - |
| สัดส่วนการใช้สินค้าและบริการจากไทยสะสม: | - | สัดส่วนการใช้สินค้าและบริการจากไทย: | - |

ประมาณการเบิกจ่ายรายปี (ปีงบประมาณ)

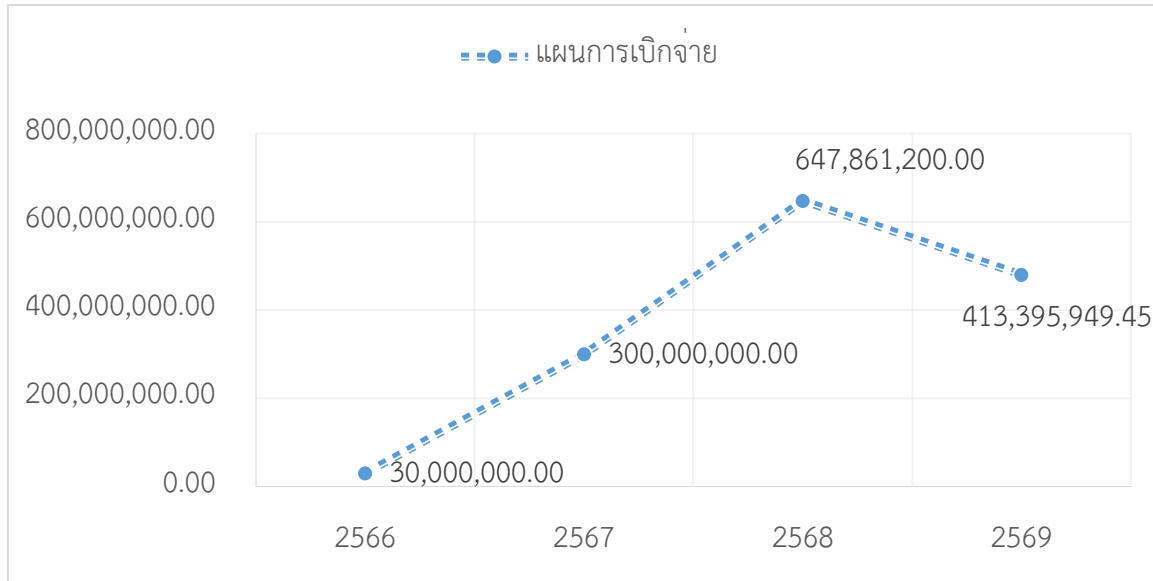


5. สถานะการดำเนินโครงการ ณ เดือน พ.ค. 2567

| | ผลการดำเนินงาน | ความก้าวหน้า (ร้อยละ) |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| งานบริการที่ปรึกษา: | อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยฝ่ายเมียนมา | - |
| - บริษัทที่ปรึกษา: | - | |
| - วันที่ลงนามสัญญา: | - | |
| - มูลค่างานตามสัญญา: | - | |
| - ระยะเวลาทำงาน: | - | |
| - ขยายระยะเวลาทำงาน (ถ้ามี): | - | |
| งานก่อสร้าง: | จะดำเนินการภายหลังจากดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ | - |
| - บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง: | | |
| - วันที่ลงนามสัญญา: | | |
| - มูลค่างานตามสัญญา: | | |
| - ระยะเวลาการก่อสร้าง: | | |
| - ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง (ถ้ามี): | | |
| - การปรับเปลี่ยนงาน (VO) (ถ้ามี): | | |

6. สถานะการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม

| ระยะ | เอกสารประกอบการดำเนินงาน | สถานะการดำเนินงาน |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ระยะก่อนก่อสร้าง | - | - |
| ระยะก่อสร้าง | | |
| ระยะดำเนินการ (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) | | |

7. แผนที่โครงการ

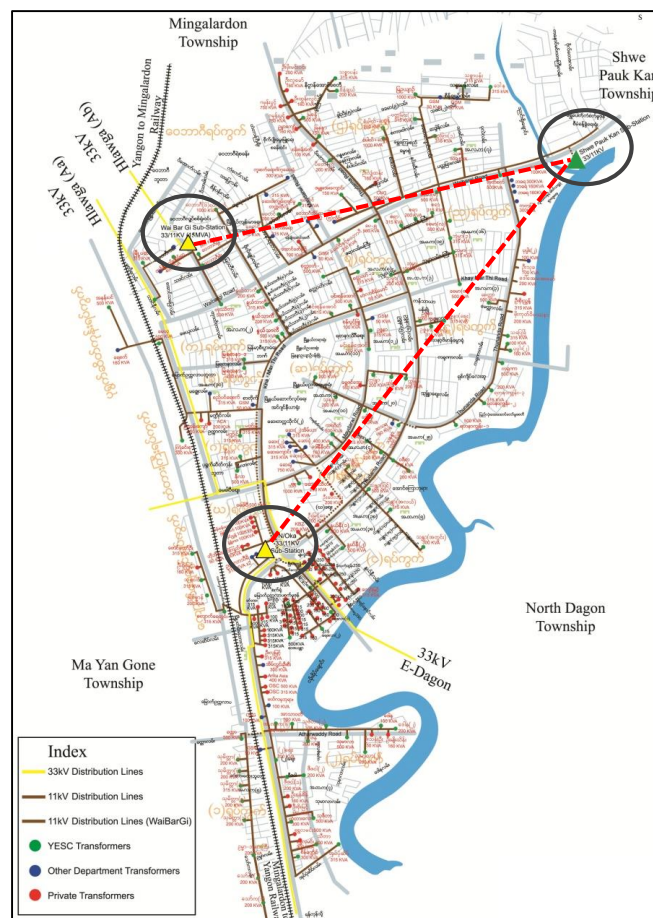

8. พื้นที่โครงการในปัจจุบัน



สถานีไฟฟ้าย่อย Wai Bar Gi



สถานีไฟฟ้าย่อย Shwe Pauk Kan



สถานีไฟฟ้าย่อย North Okkalapa



สายส่งไฟฟ้าในปัจจุบัน
