


ชื่อโครงการ	งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ 66/22 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา		
ประเทศ	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)		
สถานะโครงการ	☐ ยกร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ☒ กำกับและตรวจรับผลการศึกษา	☐ จัดจ้างผู้ให้บริการ ☐ ศึกษาแล้วเสร็จ	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy: MOEE)		
ขอบเขตโครงการ	จัดทำแบบรายละเอียด (Detailed Design: D/D) และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study: F/S)		
วันที่อนุมัติ TA	22 มกราคม 2563 คพพ. เห็นชอบให้ TA		
วงเงินอนุมัติ	ไม่เกิน 20 ล้านบาท		
วงเงินค่าจ้าง	16.69 ล้านบาท		
บริษัทผู้ให้บริการ	บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทหลัก) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		
สัญญาเลขที่	1/2564		
วันที่ลงนามสัญญา	10 มีนาคม 2564		
ระยะเวลาปฏิบัติงาน	240 วัน		
ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน	1 มิถุนายน 2564 สพพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานไปยังบริษัทที่ปรึกษา		
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน	-		
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	1. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเมียนมา 2. เกิดการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า หรือการซื้อ-ขายไฟฟ้าระหว่างไทย-เมียนมา 3. สนับสนุนแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค (Regional Investment Framework 2022) 4. ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โครงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ		
ผลการดำเนินงาน	ณ เดือนมิถุนายน 2567 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตกลงยกเลิกสัญญาจ้างผู้ให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการเพื่อปฏิบัติงานได้		
ผลการศึกษา	-		

แผนที่โครงการ



พื้นที่โครงการ

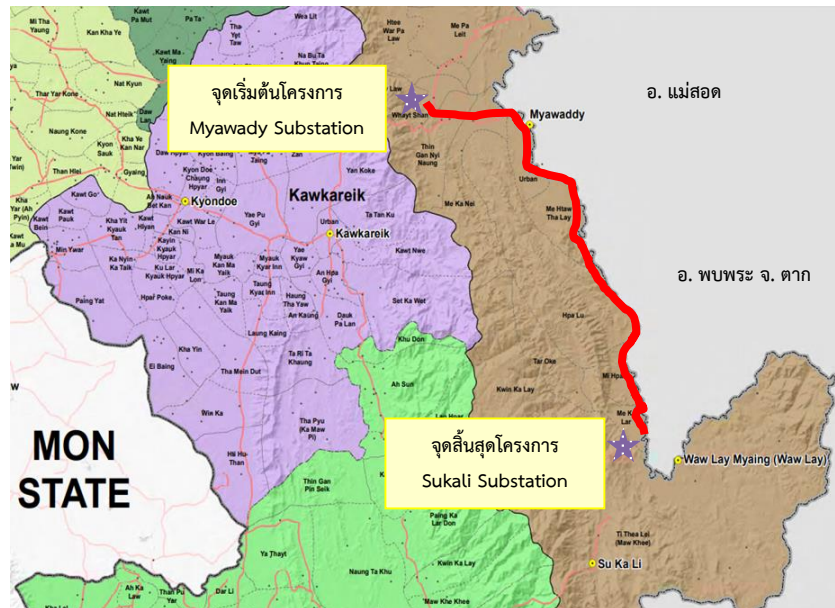
