

## โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง

## 1. ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ:	โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง		
รหัสโครงการ:	LFA 002-2004		
ประเทศ:	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)		
สาขา:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการขนส่ง</li> <li>- การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน</li> </ul>		
ปีที่ ครม. อนุมัติ:	2546		
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ:	กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) สปป.ลาว		
ขอบเขตโครงการ:	โครงการเริ่มต้นจากเมืองเงิน แขวงไชยบุรี (ติดกับชายแดนไทยบริเวณด่านห้วยโก๋น จ.น่าน) สิ้นสุดที่บ้านปากแบ่ง แขวงอุดมไชย ระยะทางรวม 49.22 กิโลเมตร		
วงเงินโครงการ (บาท):	รายการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินตามสัญญา (มีงานปรับเปลี่ยน)
	- ค่าก่อสร้าง	740,000,000	799,650,000
	- ค่าบริการที่ปรึกษา	30,000,000	35,000,000
	- ค่าบริหารจัดการ	7,000,000	4,350,000
	- ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด	62,000,000	-
	- ค่าธรรมเนียมบริหารของ สพพ.	1,000,000	-
	<b>รวม</b>	<b>840,000,000</b>	<b>839,000,000</b>
เงื่อนไขทางการเงิน:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี</li> <li>- อายุสัญญา 30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี)</li> <li>- ค่าธรรมเนียมบริหารของ สพพ. ร้อยละ 0.15</li> <li>- วันชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน</li> <li>- ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา นิติบุคคลไทย</li> <li>- การใช้สินค้าและบริการจากไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</li> <li>- กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย</li> </ul>		
ระยะเวลาก่อสร้าง:	30 เดือน		

## 2. วัตถุประสงค์โครงการ/ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

<b>วัตถุประสงค์:</b>	เพื่อก่อสร้างถนนเริ่มต้นจากเมืองเงิน แขวงไชยบุรี ติดกับชายแดนไทยบริเวณด่านห้วยโก๋น จ.น่าน) สิ้นสุดที่บ้านปากแบ่ง แขวงอุดมไชย ระยะทางรวม 49.22 กิโลเมตร
<b>ผลประโยชน์:</b>	เป็นเส้นทางสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย โดยจะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว และประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิภาค (ไทย ลาว จีน และเวียดนาม) หากโครงการแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว


## 3. วันที่สำคัญ

<b>วันที่อนุมัติ FA:</b>	1 กรกฎาคม 2546	<b>วันที่ลงนามสัญญา:</b>	5 กุมภาพันธ์ 2547
<b>วันที่สัญญามีผลบังคับ:</b>	5 กุมภาพันธ์ 2547	<b>วันที่เปลี่ยนแปลงหมวดเงินกู้ (ถ้ามี):</b>	-
<b>วันที่สิ้นสุดเบิกจ่าย:</b>	4 กุมภาพันธ์ 2552	<b>วันที่สิ้นสุดเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี):</b>	ครั้งที่ 1: 31 พ.ค. 53 ครั้งที่ 2: 30 ก.ย. 53

## 4. สถานะการดำเนินโครงการ (โครงการแล้วเสร็จ)

	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
<b>งานบริการที่ปรึกษา:</b>		100.00
- บริษัทที่ปรึกษา:	บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (Asian Engineering Consultants Co., Ltd.)	
- วันเริ่มต้น – สิ้นสุดงาน:	23 พฤศจิกายน 2549 – 31 กรกฎาคม 2553 (ขยายเวลาตามงานก่อสร้าง)	
<b>งานก่อสร้าง:</b>		100.00
- บริษัทผู้ประกอบการงานก่อสร้าง:	บริษัท แพร่ อารังวิทย์ จำกัด (Phrea Thomrongvit Co., Ltd.)	
- วันเริ่มต้น – สิ้นสุดงาน:	1 มกราคม 2550 – 31 สิงหาคม 2552 (ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553)	
<b>หมายเหตุ:</b>	สปป.ลาว ใช้เวลาในการจัดจ้างที่ปรึกษาและผู้ประกอบการงานก่อสร้างนานกว่า 2 ปี ทำให้ระยะเวลาเริ่มงานล่าช้า	

5. แผนที่โครงการ

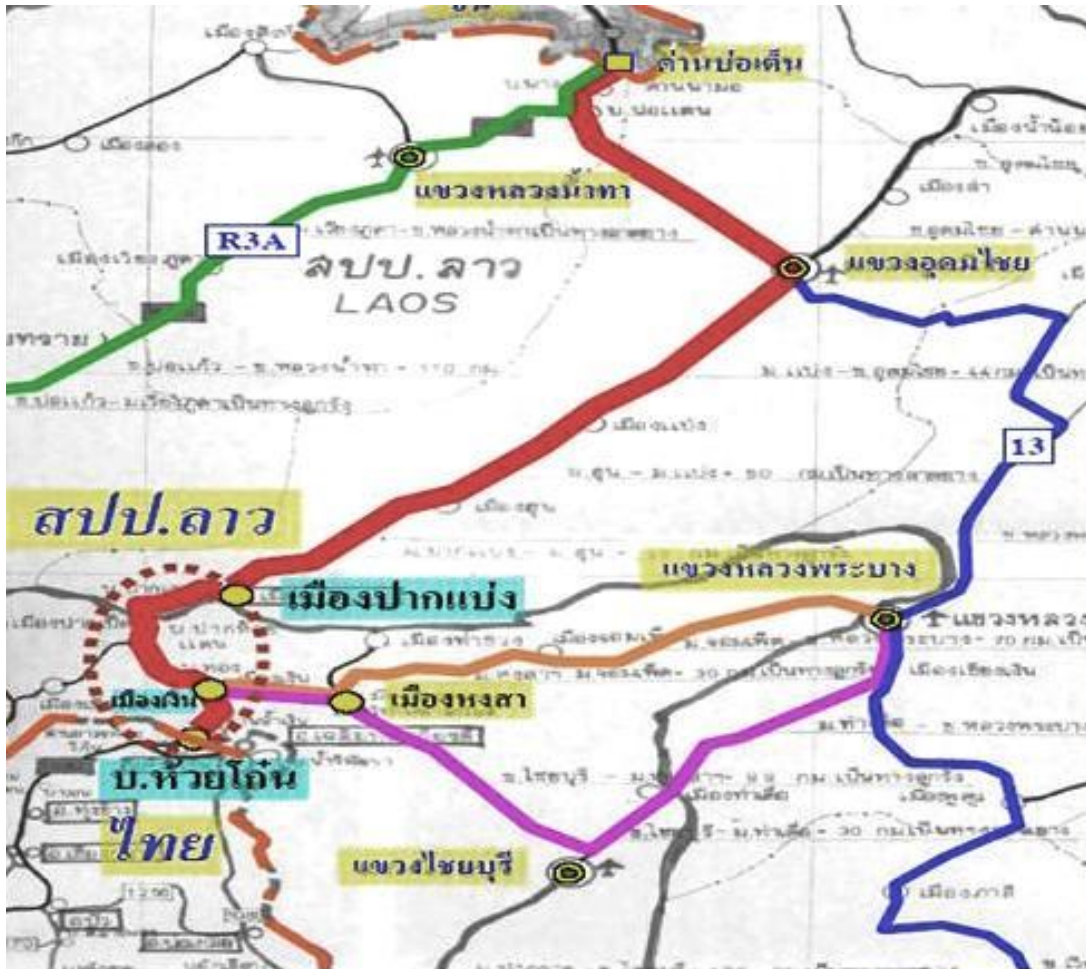

6. รูปภาพโครงการ





