

**ประเทศเมียนมา: โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  
ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา  
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)**

**1. ข้อมูลโครงการ**

ชื่อโครงการ:	โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)		
รหัสโครงการ:	MFA 002-2020		
ประเทศ:	เมียนมา		
สาขา:	การพัฒนาพื้นที่และเมือง		
ปีอนุมัติ:	2562		
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ:	Executing Agency: กระทรวงการก่อสร้างเมียนมา (Ministry of Construction: MOC) Implementing Agency: รัฐบาลท้องถิ่นรัฐกะเหรี่ยง (Kayin State Government)		
ขอบเขตโครงการ:	<b>การปรับปรุงระบบน้ำประปาในเมืองเมียวดี</b> - การก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ - การก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย - การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ - การติดตั้งโครงข่ายการจ่ายน้ำประปา <b>การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะในเมืองเมียวดี</b> - การจัดหาเครื่องมือสำหรับจัดเก็บขยะ - การก่อสร้างเตากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล - การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยจากขยะ - การปรับปรุงกระบวนการฝังกลบขยะ		
วงเงินโครงการ (บาท):	<b>รายการ</b>	<b>วงเงินอนุมัติ</b>	<b>วงเงินตามสัญญา</b>
	- ค่าก่อสร้าง	676,321,800	676,321,800
	- ค่าบริการที่ปรึกษา	33,816,100	31,160,000
	- การออกแบบรายละเอียด		
	- การควบคุมงานก่อสร้าง		
	- ค่าบริหารจัดการ	1,600,500	1,600,500
	- ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด	66,031,600	-
	<b>รวม</b>	<b>777,770,000</b>	<b>709,082,300</b>

เงื่อนไขทางการเงิน:	- อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 1.5 ต่อปี
	- อายุสัญญา	30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี)
	- ค่าธรรมเนียมบริหารของ สฟพ.	ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้
	- วันชำระเงินต้นและดอกเบี้ย	15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน
	- ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา	นิติบุคคลไทย
	- การใช้สินค้าและบริการจากไทย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
	- กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
ระยะเวลาก่อสร้าง:	ประมาณ 36 เดือน	

## 2. วัตถุประสงค์โครงการ/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์:	1) เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาและโครงข่ายการจ่ายน้ำประปา 2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ
ผลประโยชน์:	1) การปรับปรุงระบบน้ำประปาจะช่วยลดระดับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองกว่า 19,303ครัวเรือน หรือร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเมืองเมียวดี 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะจะสามารถแก้ไขคุณภาพน้ำและน้ำเน่าเสียบริเวณริมแม่น้ำเมยให้ดีขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงจากสารเคมีในขยะที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งน้ำ และอากาศของเมืองเมียวดี และริมแม่น้ำเมยในฝั่งไทยให้ดีขึ้น 3) ลดผลกระทบเชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในไทย 4) เสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในเมียนมา ตลอดจนพัฒนาห่วงโซ่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนการพัฒนาเมืองคู่แฝด “เมียวดี-แม่สอด”


## 3. วันที่สำคัญ

วันที่อนุมัติ FA:	24 ธันวาคม 2562	วันที่ลงนามสัญญา:	24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สัญญามีผลบังคับ:	24 กุมภาพันธ์ 2563	Restructuring (ถ้ามี):	-
วันที่สิ้นสุดเบิกจ่าย:	23 กุมภาพันธ์ 2568	Revised Closing (ถ้ามี):	-

## 4. ยอดการเบิกจ่าย ณ เดือนมิถุนายน 2567

วงเงินกู้:	777,770,000 บาท	วงเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี):	-
วงเงินเบิกจ่ายสะสม:	-	การเบิกจ่าย (ณ ม.ค. 66):	-
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย:	709,082,300 บาท	ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม:	-
สัดส่วนการใช้สินค้าและบริการจากไทยสะสม:	-	สัดส่วนการใช้สินค้าและบริการจากไทย:	-

## ประมาณการเบิกจ่ายรายปี (ปีงบประมาณ)

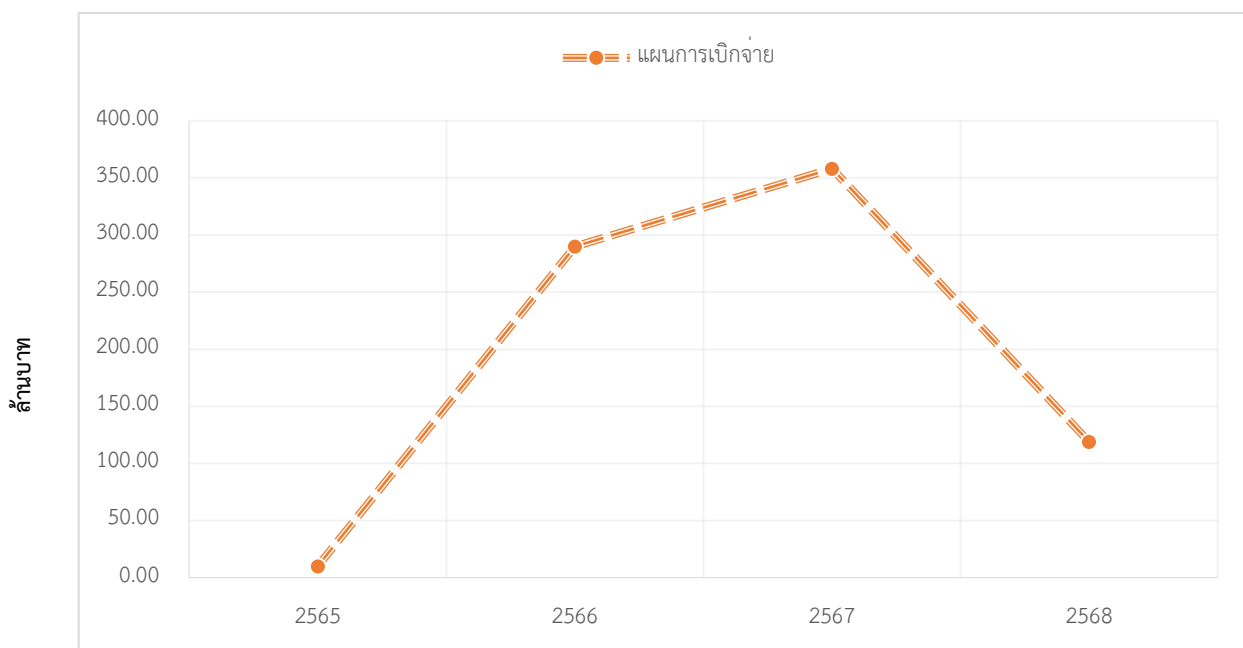

## 5. สถานะการดำเนินโครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2567

	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
งานบริการที่ปรึกษา:	- ณ มิ.ย. 67 ฝ่ายเขียนมาอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง	-
- บริษัทที่ปรึกษา:	บริษัท เซาท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด (SEATEC)	
- วันที่ลงนามสัญญา:	19 กุมภาพันธ์ 2564	
- มูลค่างานตามสัญญา:	31,160,000 บาท	
- ระยะเวลาทำงาน:	36 เดือน	

- ขยายระยะเวลาทำงาน (ถ้ามี):	-	
งานก่อสร้าง:	จะดำเนินการภายหลังจากออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ	-
- บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง:	-	
- วันที่ลงนามสัญญา:	-	
- มูลค่างานตามสัญญา:	-	
- ระยะเวลาการก่อสร้าง:	-	
- ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง (ถ้ามี):	-	
- การปรับเปลี่ยนงาน (VO) (ถ้ามี):	-	

#### 6. สถานะการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม

ระยะ	เอกสารประกอบการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
ระยะก่อนก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารรับรองมาตรการป้องกันผลกระทบฯ</li> <li>- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)</li> </ul>	<p>เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงการวางแผน การเงิน และอุตสาหกรรม เมียนมา จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม ออกโดยกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ สพพ. (No. Treasury/Debt/NEDA (635/2019-20) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)</p>
ระยะก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานติดตามการดำเนินงาน</li> <li>- เอกสารรับรองมาตรการป้องกันผลกระทบฯ และรายงานประจำปี</li> </ul>	-
ระยะดำเนินการ (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารรับรองมาตรการป้องกันผลกระทบฯ</li> </ul>	-

### 7. แผนที่โครงการ

