

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR)

โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั้ง และเมืองสังข์ทอง และโครงการก่อสร้างถนนจากภูคู้ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) – เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

1. ความเป็นมาของโครงการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือที่มีชื่อย่อว่า “สพพ.” เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีภารกิจหลักในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ด้านคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาเมือง โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบของเงินให้เปล่า และเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน ซึ่งนับว่าเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายทางการต่างประเทศระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านให้ความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น และยังเป็นความร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกันในอนุภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการช่วยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน

อนึ่งตามประกาศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เรื่อง การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 กำหนดให้

1.1 ทุกโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จและสิ้นสุดการเบิกจ่ายเงิน ต้องประเมินและจัดทำรายงานปิดโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของ สพพ. เพื่อเป็นเครื่องมือหรือระบบที่จะใช้ในการวัดความสำเร็จและผลกระทบของโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สพพ.

1.2 ทุกโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สพพ. เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จและสิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินครบ 3 ปี ต้องประเมินและจัดทำรายงานประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการ โดย สพพ. จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและบทเรียนที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการและประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต

ทั้งนี้ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพพ. มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่แล้วเสร็จครบ 3 ปี จำนวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั้ง และเมืองสังข์ทอง และ (2) โครงการก่อสร้างถนนจากภูคู้ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ดังนั้น สพพ. จึงได้กำหนดแผนงานด้านการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่กล่าว โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.1 เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางด้านความเหมาะสมและสอดคล้อง ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ

2.2 เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ความต้องการ และศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการให้เต็มที่ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของโครงการให้มากขึ้น โดยเสนอแนะโครงการลงทุนที่จำเป็นเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เป็นการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนไทย ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน

2.3 เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดจากโครงการ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการและประเทศไทย


2.4 เพื่อจัดทำทบทวนและข้อเสนอแนะของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.

3. พื้นที่โครงการ

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ทั้งในส่วนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

3.1 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั่ง และเมืองสังข์ทอง (รูปที่ 1) ประกอบด้วย


- (1) เส้นทางหลัก : ปรับปรุงถนนเริ่มต้นจากบริเวณบ้านตาดทองถึงบ้านน้ำสั่ง โดยมีผิวถนนเป็นแบบ Asphaltic Concrete (AC) ระยะทางรวม 56 กิโลเมตร และ
- (2) เส้นทางรอง : เชื่อมจากเส้นทางหลักที่บ้านปากตอนไปยังเมืองสังข์ทอง ระยะทาง 17 กิโลเมตร และจากเมืองสังข์ทองมาบรรจบถนนเส้นทางหลักที่บ้านโคกแห่ ระยะทาง 9 กิโลเมตร โดยมีผิวถนนเป็นแบบ Double Bituminous Surface Treatment (DBST)

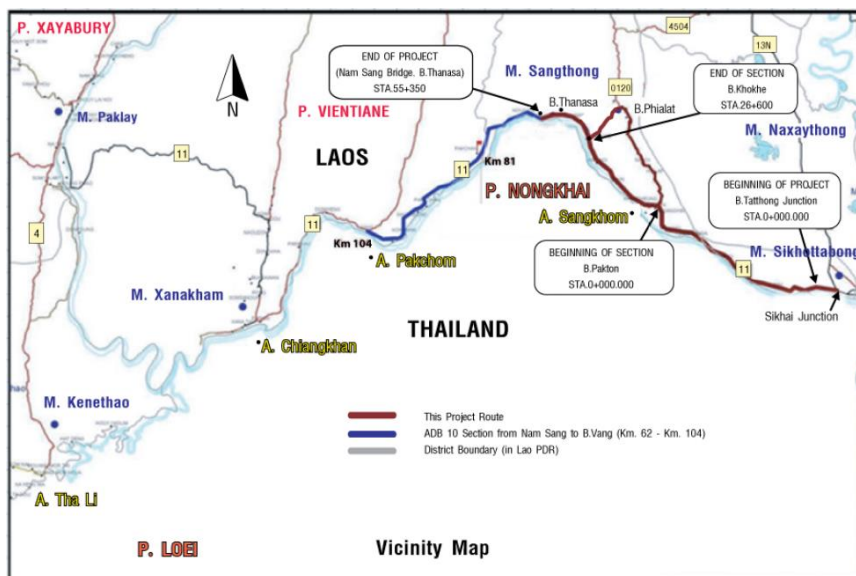

รูปที่ 1 พื้นที่เส้นทางของโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั่ง และเมืองสังข์ทอง

3.2 โครงการก่อสร้างถนนจากภูตู่ (อ.บ้านโคก จ.อุดรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว (ดูรูปที่ 2) ประกอบไปด้วย

- (1) เส้นทางหลัก : มีจุดเริ่มต้นที่ด่านภูตู่ จังหวัดอุดรดิตถ์ และมีจุดสิ้นสุดที่บ้านแก่งสาว เมืองปากลาย สปป.ลาว ระยะทางรวม 27.6 กิโลเมตร และ
- (2) เส้นทางท้องถิ่น : มีระยะทางรวม 4.3 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
 - ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านผาแก้ว ระยะทางรวม 1.8 กิโลเมตร และ
 - ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านบ่มเลา ระยะทางรวม 2.5 กิโลเมตร

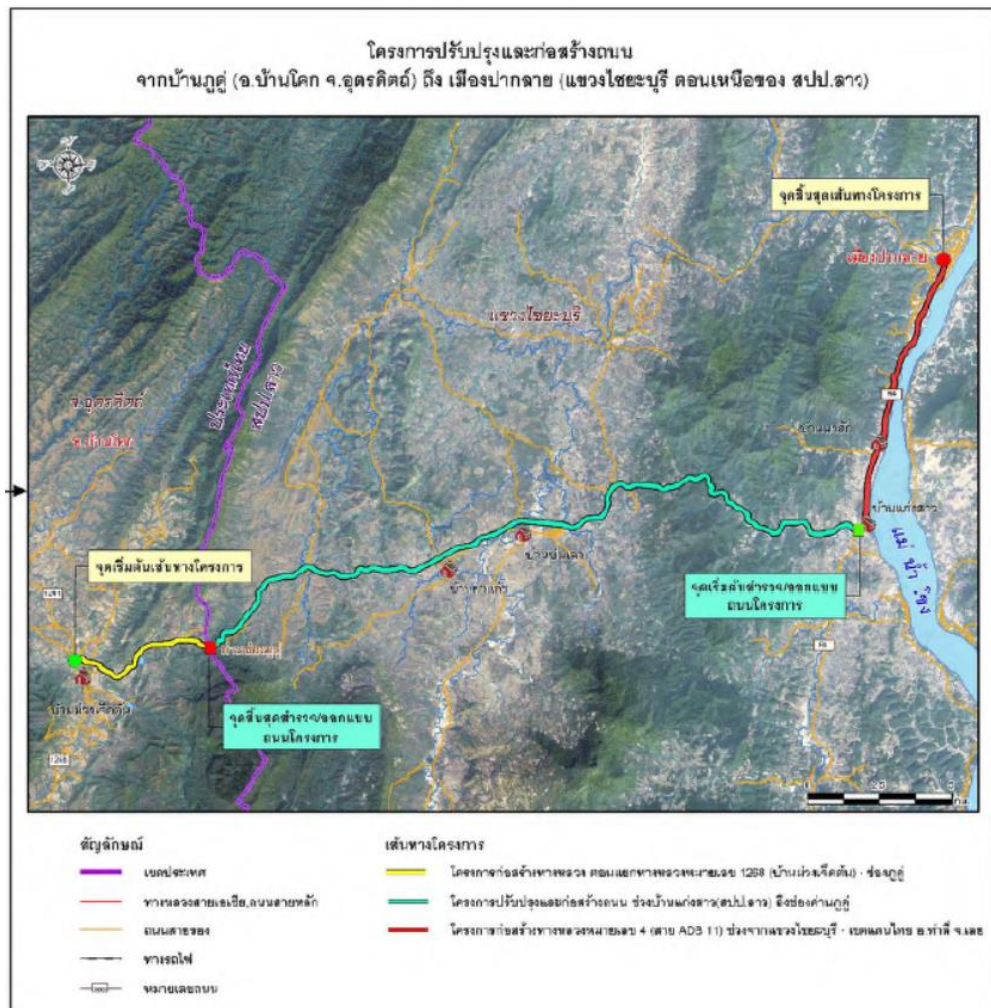

**รูปที่ 2 พื้นที่เส้นทางของโครงการก่อสร้างถนน
จากภูตู่ (อ.บ้านโคก จ.อุดรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว**

4. ขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินงานโครงการ โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

4.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงสำรวจสภาพข้อเท็จจริงของเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคภาพรวมของการพัฒนา

ตามแนวพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และอนุภูมิภาค ได้รับจากการโครงการให้ความช่วยเหลือ

4.2 ศึกษาและประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงการ โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องของโครงการกับนโยบายของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ รวมถึงความเหมาะสมสอดคล้องของโครงการในการรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4.3 ศึกษาผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีโครงการ โดยเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานหรือผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study : FS) ก่อนมีโครงการ

4.4 ศึกษาและประเมินความมีประสิทธิภาพของโครงการ โดยการประเมินประสิทธิภาพระหว่าง การดำเนินโครงการ และเปรียบเทียบกับแผนงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

4.5 ศึกษาและประเมินความมีประสิทธิภาพของโครงการ โดยการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการกับแผนงานที่วางไว้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้

4.6 ศึกษาและประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โดยเปรียบเทียบกับนโยบายเป้าหมาย และขอบเขตการดำเนินงานที่คาดหวังก่อนเริ่มโครงการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อโครงการเสร็จแล้ว

4.7 ศึกษาและประเมินผลประโยชน์และผลกระทบทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การลงทุน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ทั้งผลในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรง และทางอ้อม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนมีโครงการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการดำเนินโครงการ

4.8 ศึกษาและประเมินความยั่งยืนของโครงการ โดยการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการโครงการเมื่อเปิดใช้งาน ทั้งในแง่โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ จำนวนและความสามารถของบุคลากร ผู้รับผิดชอบ แผนการบำรุงรักษา รวมทั้งงบประมาณที่จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการโครงการ

4.9 ศึกษาและประเมินความคุ้มค่าของโครงการทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม จากการใช้ประโยชน์ของโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศ มูลค่าการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง และประเมินความคุ้มค่าของเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะคืนกลับมาในอนาคตของโครงการนั้นๆ รวมถึงการประเมินความต้องการและวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติม เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มที่

4.10 ประเมินความสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ความเห็น และทัศนคติที่มีต่อประเทศไทย จากการให้ความช่วยเหลือโครงการที่กล่าว ทั้งในแง่ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว จากประชาชนที่ใช้บริการ และที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

4.11 การประเมินผลภาพรวมในข้อ 4.1 ถึง 4.9 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว (Joint Evaluation) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและข้อคิดเห็นถึงผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการ ที่สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งสองฝ่าย

4.12 สรุปปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการโครงการ และข้อจำกัดในพื้นที่โครงการว่ามีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการโครงการ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความสูญเสียเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์โครงการให้เต็มที่ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นบทเรียนแก่โครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต

4.13 จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาเบื้องต้นและรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลที่สนใจอย่างน้อย 50 คน

5. ระยะเวลาการศึกษาและกำหนดส่งรายงาน

บริษัทที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดนี้ให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาภายในระยะเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานจาก สฟพ.

6. การส่งมอบรายงานและเอกสาร

ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานและเอกสารต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

6.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานเบื้องต้น เป็นภาษาไทย จำนวน 8 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน รายงานเบื้องต้นจะประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ แผนการดำเนินงาน การจัดองค์บริหารโครงการ และกำหนดเวลาการทำงาน แนวทางรูปแบบและวิธีการศึกษา ตามขอบเขตการศึกษา ฯลฯ

6.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้า เป็นภาษาไทย จำนวน 8 เล่ม ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน รายงานความก้าวหน้าจะประกอบด้วย เนื้อหาสาระของการศึกษาตามแนวทางและวิธีการศึกษาที่ได้เสนอไว้ ความก้าวหน้าในการศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข

6.3 รายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานระหว่างการศึกษา เป็นภาษาไทย จำนวน 8 เล่ม ภายใน 120 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน รายงานระหว่างการศึกษาจะประกอบด้วย เนื้อหาสาระของการศึกษาตามแนวทางและวิธีการศึกษาที่ได้เสนอไว้ ความก้าวหน้าในการศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข รวมถึงผลที่ได้จากการจัดทำประเมินผลร่วมกัน (Joint Evaluation) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว

6.4 ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

ที่ปรึกษาต้องจัดส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย เป็นภาษาไทย จำนวน 8 เล่ม ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน โดยร่างรายงานดังกล่าวต้องนำเสนอผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติตามทั้งหมดตามขอบเขตการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ พร้อมข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อไป

6.5 รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานขั้นสุดท้าย เป็นภาษาไทย จำนวน 20 เล่ม รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เป็นภาษาไทย จำนวน 15 เล่ม และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 15 เล่ม ภายใน 210 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน รายงานฉบับนี้จะแสดงผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติมาทั้งหมดตามขอบเขตของการศึกษาที่กำหนดไว้ และได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงแล้ว ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับการศึกษาและจากการสัมมนา

6.6 แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

ที่ปรึกษาต้องส่ง CD-ROM ซึ่งบรรจุรายงานขั้นสุดท้ายภาษาไทยและรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ชุด (ให้สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้ใน 1 ชุด) และเอกสาร วีดีโอ ภาพถ่าย และข้อมูลต่าง ที่ได้จากการปฏิบัติงานทั้งหมดสำหรับโครงการนี้ให้ สพพ. ในรูปแบบของแผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด ภายใน 210 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เอกสารผลงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษาถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สพพ. หลังสิ้นสุดโครงการ ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบต้นฉบับงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง พิมพ์ หรือผลิตเพิ่มเติมได้ให้ สพพ. ทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทที่ปรึกษามีความประสงค์จะนำไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจาก สพพ. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

7. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

7.1 ที่ปรึกษาต้องเป็นบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย และมีรายชื่อในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเสนอราคา และไม่เป็นผู้อยู่ในรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

7.2 ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

7.3 ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปกับ สพพ. ให้รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

7.4 ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

7.5 ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมินในครั้งนี้ ตั้งแต่กระบวนการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study) การออกแบบรายละเอียด (Detailed design) จนถึงการควบคุมการก่อสร้าง (Construction Supervision)

8. บุคลากรหลัก

ที่ปรึกษาต้องเสนอผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ มีความชำนาญเกี่ยวกับงานวิชาชีพและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ตลอดจนการสื่อสารเป็นอย่างดีเยี่ยม โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

- 8.1 ผู้จัดการโครงการ
- 8.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
- 8.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม
- 8.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 8.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา/งานทาง
- 8.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง

รวมทั้งมีจำนวนบุคลากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ เพื่อดำเนินการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ จำนวนคน-เดือน ของบุคลากรหลักต้องเป็นคนไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังต้องจัดเตรียมสำนักงานและอุปกรณ์ของที่ปรึกษา และรับผิดชอบดำเนินงานในทุกด้าน ตลอดจนการเสนอแผนบุคลากร และแผนการดำเนินงานที่ทำให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ สฟพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

9. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการศึกษาประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

10. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

11. หน้าที่ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

11.1 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สฟพ.) จะแต่งตั้งคณะผู้ประสานงานโครงการ (Counterparts) และมอบอำนาจความรับผิดชอบให้แก่คณะผู้ประสานงานโครงการนี้ ในนามของ สฟพ. เพื่อประสานงานและให้การสนับสนุนงานในด้านต่างๆ แก่ที่ปรึกษาตลอดช่วงเวลาดำเนินการ

11.2 สฟพ. จะให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว

11.3 สฟพ. จะช่วยประสานกับหน่วยงานราชการของไทย และประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้ที่ปรึกษาได้ขอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจะจัดหาข้อมูลและเอกสารต่างๆ เท่าที่มีอยู่ในความครอบครองของ สฟพ. ซึ่งเกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการตามสัญญา นี้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

11.4 ภายใต้ขอบเขตอำนาจและสิทธิของ สฟพ. สฟพ. จะช่วยประสานกับหน่วยงานราชการของไทย และประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 2 ประเทศ ในการให้ความสะดวกแก่ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษาเข้าไปในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะและของเอกชนเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

12. การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 5 งวด ดังนี้

12.1 งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง หลังจากผู้รับจ้างจัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ตามข้อกำหนดส่งมอบงานในข้อ 6.1 และได้ผ่านการตรวจรับแล้ว

12.2 งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง หลังจากผู้รับจ้างจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ตามขอบเขตงานที่กำหนดในข้อ 6.2 และได้ผ่านการตรวจรับแล้ว

12.3 งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง หลังจากผู้รับจ้างจัดส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) ตามขอบเขตของการศึกษาที่กำหนดในข้อ 6.3 และได้ผ่านการตรวจรับแล้ว

12.4 งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง หลังจากผู้รับจ้างจัดส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) ตามขอบเขตของการศึกษาที่กำหนดในข้อ 6.4 และได้ผ่านการตรวจรับแล้ว พร้อมทั้งได้จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษิตตามขอบเขตของการศึกษาที่กำหนดในข้อ 4.13

12.5 งวดที่ 5 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง หลังจากผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) และรายงานสรุปผลสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ตามขอบเขตของการศึกษาที่กำหนดในข้อ 6.5 ที่ได้ผ่านการตรวจรับแล้ว พร้อมทั้งได้จัดส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามข้อ 6.6

13. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

13.1 ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ และพันธะตามสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญทางเทคนิควิทยาการอย่างดีที่สุด ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทางมาตรฐานวิชาชีพนานาชาติ ตลอดระยะเวลาโครงการ และที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานด้วยความชำนาญเอาใจใส่ บรรยายเนื้อหาให้ชัดเจน ต่อเนื่อง กระชับ และสอดคล้องกันในทุกบท

13.2 ที่ปรึกษาจะต้องเข้ามาประชุม และนำเสนอผลการศึกษิตตามรายงานที่ได้จัดส่งให้ สฟพ. และผลการสัมมนาแก่คณะกรรมการกำกับการศึกษา เพื่อพิจารณาผลการศึกษิตให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงผลการศึกษิตให้มีความสมบูรณ์

13.3 เมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาการว่าจ้างแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องพร้อมที่จะช่วยบริการให้คำปรึกษาแก่ สฟพ. ที่เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการและศักยภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ที่ปรึกษาจะดำเนินการให้เป็นอย่างดีที่สุดโดยไม่ชักช้า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อ สฟพ.

13.4 ที่ปรึกษามีเวลาให้บริการตามโครงการนี้ 210 วัน นับตั้งแต่บัดตั้งแต่วันแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาจะต้องจัดเตรียมแผนการดำเนินงานต่างๆ ภายในกำหนดเวลาและเร่งรัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของที่ปรึกษา จนเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานภายในกำหนดเวลา จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาสำหรับงานโครงการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

13.5 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบรายงานเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมทั้งวีดีโอ ภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆ สำหรับโครงการนี้ให้ สฟพ. ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

14. ระเบียบ วิธีการจัดจ้าง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

14.1 ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

14.2 ให้ดำเนินการจ้างตามระเบียบในข้อ 14.1 และพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาตามเกณฑ์ข้อ 120 (6) (ก) “กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด” เนื่องจากการดำเนินโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จมีความซับซ้อน ต้องดำเนินการประเมินทั้งด้านความเหมาะสมและสอดคล้อง ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ ตลอดจนประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ความต้องการ และศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงประเมินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดจากโครงการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการและประเทศไทย และนำมาจัดทำเป็นบทเรียน และข้อเสนอแนะต่อ สพพ.

14.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

14.3.1 พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา โดยแบ่งเป็นคะแนนด้านคุณภาพและด้านราคา ดังนี้

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) ด้านคุณภาพ | ร้อยละ 80 |
| (2) ด้านราคา | ร้อยละ 20 |

14.3.2 การพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ จะพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| (1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา | ร้อยละ 20 |
| (2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 40 |
| (3) บุคลากรที่ร่วมงาน | ร้อยละ 40 |

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางด้านคุณภาพจะต้องมีคะแนนรวมในการประเมินข้อเสนอทางด้านคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 70

15. ข้อสงวนสิทธิ์

ที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาของ สพพ. ทั้งนี้ ผลการพิจารณาและคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการยื่นข้อเสนอทางด้านคุณภาพและข้อเสนอทางด้านราคาของที่ปรึกษารั้งนี้
